市長		副市長		建設部長		財政課長		主管課長		課長補佐		検査者		設計者	

(0700000001-0)

工　　種	道路改良工事	工 事 番 号		設 計 年 月 日	令和　7 年　5 月　1 日
工　事　箇　所					
路 線 ・ 河 川 名					

令和　　7　年度
市道深苗代線修繕工事

富谷市

工　　期	令和　　年　　月　　日	着　工　期　日	令和　　年　　月　　日
	令和　　年　　月　　日	竣　工　期　限	令和　　年　　月　　日
本　工　事　費	円　　(消費税相当額　　円)	工　事　価　格	円

〈 概 要 〉

施工延長L＝171m

排水構造物撤去		
構造物とりこわし		V＝1m3
掘削工		
掘削		V＝590m3
路床盛土工		
土砂等運搬（場内）		V＝190m3
路床盛土		V＝190m3
残土処理工		
土砂等運搬（場内）		V＝360m3
整地		V＝360m3
土砂等運搬（場外）		V＝ 50m3
排水構造物		
鉄筋コンクリート水路	300×300	L＝ 32m
素掘側溝		
床掘り・埋戻し		V＝ 20m3
集水桝		
プレキャスト集水桝	600×600	N＝ 2基
管渠工		
ヒューム管（B形管）	φ400	L＝ 5m
アスファルト舗装工		
下層路盤	t＝150mm	A＝178m2
排水工		
ﾎﾟﾝﾌﾟ運転工		1式
ﾎﾟﾝﾌﾟ設置・撤去		N＝ 1箇所
交通管理工		
交通誘導警備員B		1式

本　工　事　内　訳　表

04:道路改良工事

費目・工種・細別等	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要
道路改良	式	1			
構造物撤去工	式	1			
排水構造物撤去工	式	1			
構造物とりこわし工(標準単価)機械施工 鉄筋構造物 昼間施工 時間的制約なし	m3	1			第1号単価表
殻運搬 ｺﾝｸﾘｰﾄ(鉄筋)構造物とりこわし DID区間無し 運搬距離3.3km以下	m3	1			第2号単価表
建設廃棄物処理費 中間処理･再生資源化施設 仙台東 東北黒沢建設工業㈱ 鶴巣ﾘｻｲｸﾙｾﾝﾀｰ ｺﾝｸﾘｰﾄ有筋	m3	1			
道路土工	式	1			
掘削工	式	1			
掘削 土砂 上記以外(小規模) 標準	m3	590			第3号単価表
路床盛土工	式	1			

本　工　事　内　訳　表

04:道路改良工事

費目・工種・細別等	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要
土砂等運搬 小規模 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.28m3(平積0.2m3) DID区間無し 運搬距離0.2km以下	m3	190			第4号単価表
路床盛土 施工幅員2.5m未満	m3	190			第5号単価表
残土処理工	式	1			
土砂等運搬 小規模 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.28m3(平積0.2m3) DID区間無し 運搬距離0.2km以下	m3	360			第4号単価表
整地 敷均し(ﾙｰｽﾞ) 障害無し 施工数量標準(10,000m3未満)	m3	360			第6号単価表
土砂等運搬 小規模 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.28m3(平積0.2m3) DID区間無し 運搬距離7.5km以下	m3	50			第7号単価表
建設廃棄物処理費 石積　安藤建設工業株式会社	m3	50			
排水構造物工	式	1			
側溝工	式	1			
床掘り 土砂 上記以外(小規模)	m3	20			第8号単価表

本　工　事　内　訳　表

04:道路改良工事

費目・工種・細別等	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要
埋戻し 上記以外(小規模) 土砂	m3	10			第9号単価表
排水構造物工(標準単価)U型側溝 L=2,000mm 1000kg/個以下 昼間施工 時間的制約なし	m	32			第10号単価表
鉄筋コンクリート水路 300C　前田製管製　同等品以上 300*300*2000	個	16			参考質量　244kg/個
モルタル練 普通ｾﾒﾝﾄ	m3	0.3			第11号単価表
再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40	m3	1			
単粒度砕石 5号 20-13mm	m3	1			
素掘側溝	式	1			
床掘り（素掘側溝部） 土砂 現場制約あり	m3	20			第12号単価表
埋戻し（盛土畦畔部） 現場制約あり 土砂 締固め無し	m3	20			第13号単価表
集水桝･ﾏﾝﾎｰﾙ工	式	1			

本　工　事　内　訳　表

04:道路改良工事

費目・工種・細別等	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要
プレキャスト集水桝 据付 400kgを超え600kg以下 基礎砕石無し	基	1			第14号単価表
集水桝 □600*600 600B	個	2			参考質量　289kg
コンクリート 無筋･鉄筋構造物 人力打設 18-8-40(高炉)	m3	0.05			第15号単価表
管渠工	式	1			
ヒューム管（B形管） 据付 管径400mm 固定基礎90° 巻き 基礎砕石有り 18-8-40(高炉)	m	5			第16号単価表
舗装工	式	1			
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工	式	1			
下層路盤（車道・路肩部） 1層施工 全仕上り厚150mm 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40	m2	178			第17号単価表
仮設工	式	1			
排水工	式	1			

本　工　事　内　訳　表

04:道路改良工事

費目・工種・細別等	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要
ﾎﾟﾝﾌﾟ運転工(締切排水工) 排水量0～40m3/h未満 作業時排水 揚程10m以下 発動発電機使用	日				第18号単価表
ﾎﾟﾝﾌﾟ設置･撤去	箇所	1			第19号単価表
交通管理工	式	1			
交通誘導警備員B	人				
直接工事費	式	1			
共通仮設費	式	1			
率計算分	式	1			
現場環境改善費	式	1			
純工事費	式	1			
現場管理費	式	1			

本　工　事　内　訳　表

04:道路改良工事

費目・工種・細別等	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要
率計算分	式	1			
工事原価	式	1			
一般管理費等	式	1			
一般管理費	式	1			
率計算分	式	1			
契約保証費	式	1			
工事価格	式	1			
消費税等相当額	式	1			
本工事費	式	1			

第1号 S651000 J01

構造物とりこわし工(標準単価)機械施工 1m3当たり単価表

鉄筋構造物
昼間施工 時間的制約なし
Ⅵ-1-④-1

名称 ・ 規格 ・ 条件	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
構造物取壊し工 昼間 鉄筋構造物 機械施工 制約無	m3	1				通期
合 計	m3	1				
構造物種別A = 02 鉄筋構造物 時間的制約B = 01 なし			施工区分C = 01 昼間施工 低騒音・低振動対策D = 01 低騒音・低振動対策無し			

第2号 SPG2225010 J01

殻運搬 1m3当たり単価表

ｺﾝｸﾘｰﾄ(鉄筋)構造物とりこわし
DID区間無し 運搬距離3.3km以下
Ⅱ-2-25-1

名称 ・ 規格 ・ 条件	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ損料 ｵﾝﾛｰﾄﾞ・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ 10t積級(ﾀｲﾔ損耗費及び補修費(良好)を含む)	供用日					
運転手(一般)	人					通期
軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油 1.2号	L					
施工パッケージ単価	m3	1				
合 計	m3	1				
殻発生作業A = 02 ｺﾝｸﾘｰﾄ(鉄筋)構造物とりこわし 積込工法区分B = 01 機械積込			DID区間の有無C = 01 無し 運搬距離(3)F = 02 3.3km以下			

富谷市

第3号 SPG2102010 J01

掘削 1m3当たり単価表

土砂 上記以外(小規模)
標準
Ⅱ-1-②-7

名称 ・ 規格 ・ 条件	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)損料 標準型・排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値) 山積0.28m3(平積0.2m3)	供用日					
運転手(特殊)	人					通期
軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油 1.2号	L					
施工パッケージ単価	m3	1				
合 計	m3	1				
土質A = 01 土砂 施工方法B = 05 上記以外(小規模)			施工数量E = 07 標準			

第4号 SPG2102020 J02

土砂等運搬 1m3当たり単価表

小規模 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.28m3(平積0.2m3)
DID区間無し 運搬距離0.2km以下
Ⅱ-1-②-13

名称 ・ 規格 ・ 条件	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ損料 ｵﾝﾛｰﾄﾞ・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ 4t積級(ﾀｲﾔ損耗費及び補修費(良好)を含む)	供用日					
運転手(一般)	人					通期
軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油 1.2号	L					
施工パッケージ単価	m3	1				
合 計	m3	1				
土砂等発生現場A = 02 小規模 積込機種・規格B = 05 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.28m3(平積0.2m3) 土質C = 01 土砂(岩塊・玉石混り土含む)			DID区間の有無D = 01 無し 運搬距離(9)M = 01 0.2km以下			

富谷市

第5号 SPG2102050 J01

路床盛土 1m3当たり単価表

施工幅員2.5m未満

Ⅱ-1-②-24

名称 ・ 規格 ・ 条件	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
振動ﾛｰﾗ[舗装用](ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式) 運転質量 0.8～1.1t	日					通期
普通作業員	人					通期
特殊作業員	人					通期
軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油 1.2号	L					
施工パッケージ単価	m3	1				
合 計	m3	1				
施工幅員A = 01 2.5m未満						

第6号 SPG2102030 J02

整地 1m3当たり単価表

敷均し(ﾙｰｽﾞ) 障害無し
施工数量標準(10,000m3未満)
Ⅱ-1-②-20

名称 ・ 規格 ・ 条件	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型] 山積0.8m3(平0.6m3)	日					通期
運転手(特殊)	人					通期
軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油 1.2号	L					
施工パッケージ単価	m3	1				
合 計	m3	1				
作業区分A = 02 敷均し(ﾙｰｽﾞ) 施工数量B = 01 標準(10,000m3未満)			障害の有無C = 01	無し		

第7号 SPG2102020 J01

土砂等運搬 1m3当たり単価表

小規模 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.28m3(平積0.2m3)
DID区間無し 運搬距離7.5km以下
Ⅱ-1-②-13

名称 ・ 規格 ・ 条件	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ損料 ｵﾝﾛｰﾄﾞ・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ 4t積級(ﾀｲﾔ損耗費及び補修費(良好)を含む)	供用日					
運転手(一般)	人					通期
軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油 1.2号	L					
施工パッケージ単価	m3	1				
合 計	m3	1				
土砂等発生現場A = 02 小規模 積込機種・規格B = 05 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.28m3(平積0.2m3) 土質C = 01 土砂(岩塊・玉石混り土含む)			DID区間の有無D = 01 無し 運搬距離(9)M = 09 7.5km以下			

第8号 SPG2103010 J02

床掘り 1m3当たり単価表

土砂 上記以外(小規模)

Ⅱ-1-③-4

名称 ・ 規格 ・ 条件	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)損料 後方超小旋回型･排対型(第2次基準値) 山積0.28m3(平積0.2m3)	供用日					
運転手(特殊)	人					通期
普通作業員	人					通期
軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油 1.2号	L					
施工パッケージ単価	m3	1				
合 計	m3	1				
土質A = 01 土砂			施工方法B = 05	上記以外(小規模)		

第9号 SPG2103050 J02

埋戻し 1m3当たり単価表

上記以外(小規模)
土砂
Ⅱ-1-③-13

名称 ・ 規格 ・ 条件	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)損料 後方超小旋回型･排対型(第2次基準値) 山積0.28m3(平積0.2m3)	供用日					
ﾀﾝﾊﾟ及びﾗﾝﾏ損料 ﾗﾝﾏ 質量60～80kg	供用日					
普通作業員	人					通期
特殊作業員	人					通期
運転手(特殊)	人					通期
軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油 1.2号	L					
ｶﾞｿﾘﾝ ﾚｷﾞｭﾗｰ	L					
施工パッケージ単価	m3	1				
合 計	m3	1				
施工方法A = 05 上記以外(小規模)			土質B = 01	土砂		

富谷市

第10号　S651700 J01

排水構造物工(標準単価)U型側溝 10m当たり単価表

L=2,000mm 1000kg/個以下
昼間施工 時間的制約なし
材料別途計上 Ⅵ-1-⑥-1

名称 ・ 規格 ・ 条件	単位	数量	単価	金額	雑	摘要
U型側溝 L2000 1000kg以下 昼 無	m	10				通期
合 計	m	10				
単位当り	m	1				
作業区分[K6]A = 01 設置 規格・仕様区分B = 03 L=2,000mm 1000kg/個以下 時間的制約C = 01 なし 施工区分D = 01 昼間施工			側溝本体の長さ(mm)E = 03 L=2000 施工箇所区分[K34]F = 01 施工箇所区分による補正無し 基礎砕石施工補正[K5]G = 01 無			

第11号 SPG2401020 A01

モルタル練 1m3当たり単価表

普通ｾﾒﾝﾄ

Ⅱ-4-①-8

名称 ・ 規格 ・ 条件	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員	人					通期
土木一般世話役	人					通期
ｾﾒﾝﾄ(普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ) 25kg袋入	t					
砂 洗い細目	m3					
施工パッケージ単価	m3	1				
合 計	m3	1				
ｾﾒﾝﾄ種類A = 01 普通						

第12号 SPG2103010 J01

床掘り（素掘側溝部） 1m3当たり単価表

土砂 現場制約あり

Ⅱ-1-③-4

名称 ・ 規格 ・ 条件	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員	人					通期
施工パッケージ単価	m3	1				
合 計	m3	1				
土質A = 01 土砂			施工方法B = 06	現場制約あり		

第13号　　SPG2103050 J01

埋戻し（盛土畦畔部）　1m3当たり単価表

現場制約あり
土砂 締固め無し
Ⅱ-1-③-13

名称 ・ 規格 ・ 条件	単位	数　　量	単　　価	金　　額	雑	摘　　要
普通作業員	人					通期
施工パッケージ単価	m3	1				
合　計	m3	1				
施工方法A = 06　現場制約あり 土質B = 01　土砂			締固めの有無C = 02　無し			

第14号　　SPG2210060 J02

プレキャスト集水桝 1基当たり単価表

据付
400kgを超え600kg以下 基礎砕石無し
Ⅱ-2-⑩-16

名称 ・ 規格 ・ 条件	単位	数　量	単　価	金　額	雑	摘　要
ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型ｸﾚｰﾝ付] 山積0.28m3吊1.7t	日					通期
運転手(特殊)	人					通期
普通作業員	人					通期
土木一般世話役	人					通期
特殊作業員	人					通期
軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油 1.2号	L					
施工パッケージ単価	基	1				
合　計	基	1				
作業区分A = 01　据付 製品質量(kg/基)B = 04　400kgを超え600kg以下			基礎砕石の有無C = 02　無し			

第15号 SPG2401010 A02

コンクリート 1m3当たり単価表

無筋･鉄筋構造物 人力打設
18-8-40(高炉)
Ⅱ-4-①-4

名称 ・ 規格 ・ 条件	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員	人					通期
特殊作業員	人					通期
土木一般世話役	人					通期
生ｺﾝｸﾘｰﾄ 高炉B 18-8-40	m3					
施工パッケージ単価	m3	1				
合 計	m3	1				
構造物種別A = 01 無筋･鉄筋構造物 打設工法B = 03 人力打設 ｺﾝｸﾘｰﾄ規格C = 29 18-8-40(高炉)		現場内	養生工の種類E = 02 一般養生 小運搬の有無G = 01 有り			

第16号の1 SPG2210010 J02

ヒューム管（B形管） 1m当たり単価表

据付 管径400㎜ 固定基礎90° 巻き
基礎砕石有り 18-8-40(高炉)
Ⅱ-2-⑩-5

名称 ・ 規格 ・ 条件	単位	数　量	単　価	金　額	雑	摘　要
ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型・後方超小旋回型・超低吊] 山積0.45m3(平積0.35m3) 吊2.9t	日					通期
普通作業員	人					通期
型わく工	人					通期
土木一般世話役	人					通期
運転手(特殊)	人					通期
ﾋｭｰﾑ管(外圧管1種) B形 400×35×2430 306kg/本	本					
生ｺﾝｸﾘｰﾄ 高炉B 18-8-40	m3					
軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油 1.2号	L					
施工パッケージ単価	m	1				
合　計	m	1				

第16号の2 SPG2210010 J02

ヒューム管（B形管） 1m当たり単価表

据付 管径400㎜ 固定基礎90° 巻き
基礎砕石有り 18-8-40(高炉)
Ⅱ-2-⑩-5

名称 ・ 規格 ・ 条件	単位	数　量	単　価	金　額	雑	摘　要
作業区分A = 01　据付 管径B = 05　400㎜ 固定基礎C = 01　90° 巻き			基礎砕石の有無D = 01　有り 規格E = 09　外圧管1種 管径400㎜ 生ｺﾝｸﾘｰﾄ規格F = 01　18-8-40(高炉)			

富谷市

第17号の1 SPG4101020 J05

下層路盤（車道・路肩部） 1m2当たり単価表

1層施工 全仕上り厚150mm
再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40
Ⅳ-1-①-4

名称 ・ 規格 ・ 条件	単位	数　量	単　価	金　額	雑	摘　要
ﾓｰﾀｸﾞﾚｰﾀﾞ損料 土工用･排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値) ﾌﾞﾚｰﾄﾞ幅3.1m	供用日					
ﾛｰﾄﾞﾛｰﾗ損料 ﾏｶﾀﾞﾑ･排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値) 運転質量10t 締固め幅2.1m	供用日					
ﾀｲﾔﾛｰﾗ[普通型] 運転質量8～20t	日					通期
運転手(特殊)	人					通期
特殊作業員	人					通期
普通作業員	人					通期
土木一般世話役	人					通期
再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40	m3					
軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油 1.2号	L					
施工パッケージ単価	m2	1				

第17号の2 SPG4101020 J05

下層路盤（車道・路肩部） 1m2当たり単価表

1層施工 全仕上り厚150mm
再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40
Ⅳ-1-①-4

名称 ・ 規格 ・ 条件	単位	数　量	単　価	金　額	雑	摘　要
合　計	m2	1				
施工区分A = 01　1層施工 全仕上り厚(mm)(1)B = 150			材料H = 06	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40		

第18号　S251000 J01

ﾎﾟﾝﾌﾟ運転工(締切排水工) 1日当たり単価表

排水量0～40m3/h未満 作業時排水
揚程10m以下 発動発電機使用
Ⅱ-5-⑧-3

名称 ・ 規格 ・ 条件	単位	数量	単価	金額	雑	摘要
特殊作業員	人					通期
工事用水中ﾓｰﾀﾎﾟﾝﾌﾟ運転 揚程10m以下 電力を計上しない φ150mm×1台	日					第20号単価表
発動発電機運転(賃料) 25kVA ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ駆動(排対型含む)	日					第21号単価表
諸雑費	%	3				
合　計	日	1				
排水量(m3/h)A = 01　0～40m3/h未満 排水種別B = 01　作業時排水			ﾎﾟﾝﾌﾟ揚程C = 01	10m以下		

第19号 S251002 J01

ﾎﾟﾝﾌﾟ設置･撤去 1箇所当たり単価表

Ⅱ-5-⑧-3

名称 ・ 規格 ・ 条件	単位	数量	単価	金額	雑	摘要
土木一般世話役	人					通期
特殊作業員	人					通期
普通作業員	人					通期
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)運転(賃料) 山積0.80m3(平積0.60m3)2.9t吊	日					第22号単価表
諸雑費	式	1				
合 計	箇所	1				

第20号　　S030000 J01

工事用水中ﾓｰﾀﾎﾟﾝﾌﾟ運転 1日当たり単価表

揚程10m以下 電力を計上しない
φ150mm×1台

名称 ・ 規格 ・ 条件	単位	数　量	単　価	金　額	雑	摘　要
工事用水中ﾎﾟﾝﾌﾟ(潜水ﾎﾟﾝﾌﾟ) 口径150mm 揚程10m 7.5KW	日					通期
諸雑費	式	1				
合　計	日	1				
規格,台数A = 01　φ150mm×1台 ﾎﾟﾝﾌﾟ揚程B = 01　10m以下 電源区分C = 01　電力を計上しない			賃料数量D = 1.2 電力消費量E = 0			

富谷市

第21号　　S016020 J01

発動発電機運転(賃料) 1日当たり単価表

25kVA ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ駆動(排対型含む)

名称 ・ 規格 ・ 条件	単位	数　量	単　価	金　額	雑	摘　要
軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油 1.2号	L	22				
発動発電機[ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ駆動] 25kVA 31.3ps	日					通期
諸雑費	式	1				
合　計	日	1				
規格A = 08 25kVA ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ駆動(排対型含む) 燃料消費量B = 22			賃料数量C = 1.2			

第22号 S028030 J01

ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)運転(賃料) 1日当たり単価表

山積0.80m3(平積0.60m3)2.9t吊

名称 ・ 規格 ・ 条件	単位	数量	単価	金額	雑	摘要
運転手(特殊)	人					通期
軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油 1.2号	L	65				
ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型ｸﾚｰﾝ付] 山積0.8m3吊2.9t	日					通期
諸雑費	式	1				
合 計	日	1				
規格A = 03 山積0.80m3(平積0.60m3)2.9t吊 運転労務数量B = 1			燃料消費量C = 65 賃料数量D = 1.16			

単 価 一 覧 表

名称 ・ 規格 ・ 条件	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
構造物とりこわし工(標準単価)機械施工 鉄筋構造物 昼間施工 時間的制約なし	m3					第1号
殻運搬 ｺﾝｸﾘｰﾄ(鉄筋)構造物とりこわし DID区間無し 運搬距離3.3km以下	m3					第2号
掘削 土砂 上記以外(小規模) 標準	m3					第3号
土砂等運搬 小規模 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.28m3(平積0.2m3) DID区間無し 運搬距離0.2km以下	m3					第4号
路床盛土 施工幅員2.5m未満	m3					第5号
整地 敷均し(ﾙｰｽﾞ) 障害無し 施工数量標準(10,000m3未満)	m3					第6号
土砂等運搬 小規模 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.28m3(平積0.2m3) DID区間無し 運搬距離7.5km以下	m3					第7号
床掘り 土砂 上記以外(小規模)	m3					第8号
埋戻し 上記以外(小規模) 土砂	m3					第9号
排水構造物工(標準単価)U型側溝 L=2,000mm 1000kg/個以下 昼間施工 時間的制約なし	m					第10号

単　価　一　覧　表

名称 ・ 規格 ・ 条件	単位	数　　量	単　　価	金　　額	雑	摘　　要
モルタル練 普通ｾﾒﾝﾄ	m3					第11号
床掘り（素掘側溝部） 土砂 現場制約あり	m3					第12号
埋戻し（盛土畦畔部） 現場制約あり 土砂 締固め無し	m3					第13号
プレキャスト集水桝 据付 400kgを超え600kg以下 基礎砕石無し	基					第14号
コンクリート 無筋･鉄筋構造物 人力打設 18-8-40(高炉)	m3					第15号
ヒューム管（Ｂ形管） 据付 管径400mm 固定基礎90° 巻き 基礎砕石有り 18-8-40(高炉)	m					第16号
下層路盤（車道・路肩部） 1層施工 全仕上り厚150mm 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40	m2					第17号
ﾎﾟﾝﾌﾟ運転工(締切排水工) 排水量0～40m3/h未満 作業時排水 揚程10m以下 発動発電機使用	日					第18号
ﾎﾟﾝﾌﾟ設置･撤去	箇所					第19号
工事用水中ﾓｰﾀﾎﾟﾝﾌﾟ運転 揚程10m以下 電力を計上しない φ150mm×1台	日					第20号

単　価　一　覧　表

名称 ・ 規格 ・ 条件	単位	数　　量	単　　価	金　　額	雑	摘　　要
発動発電機運転(賃料) 25kVA ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ駆動(排対型含む)	日					第21号
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)運転(賃料) 山積0.80m3(平積0.60m3)2.9t吊	日					第22号
砂 洗い細目	m3					
建設廃棄物処理費 石積　安藤建設工業株式会社	m3					
鉄筋コンクリート水路 300C　前田製管製　同等品以上 300*300*2000	個					参考質量　244kg/個
集水桝 □600*600 600B	個					参考質量　289kg

集計一覧表

名称 ・ 規格 ・ 条件	単位	数　量	単　価	金　額	雑	摘　要
建設廃棄物処理費 石積　安藤建設工業株式会社	m3	50				
集水桝 □600*600 600B	個	2				参考質量　289kg
鉄筋コンクリート水路 300C　前田製管製　同等品以上 300*300*2000	個	16				参考質量　244kg/個
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)損料 標準型・排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値) 山積0.28m3(平積0.2m3)	供用日					
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)損料 後方超小旋回型・排対型(第2次基準値) 山積0.28m3(平積0.2m3)	供用日					
ﾓｰﾀｸﾞﾚｰﾀﾞ損料 土工用・排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値) ﾌﾞﾚｰﾄﾞ幅3.1m	供用日					
ﾛｰﾄﾞﾛｰﾗ損料 ﾏｶﾀﾞﾑ・排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値) 運転質量10t 締固め幅2.1m	供用日					
ﾀﾝﾊﾟ及びﾗﾝﾏ損料 ﾗﾝﾏ 質量60～80kg	供用日					
特殊作業員	人					通期
普通作業員	人					通期

集計一覧表

名称 ・ 規格 ・ 条件	単位	数　量	単　価	金　額	雑	摘　要
運転手(特殊)	人					通期
運転手(一般)	人					通期
土木一般世話役	人					通期
型わく工	人					通期
交通誘導警備員B	人					
ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型ｸﾚｰﾝ付] 山積0.8m3吊2.9t	日					通期
ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型] 山積0.8m3(平0.6m3)	日					通期
ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型ｸﾚｰﾝ付] 山積0.28m3吊1.7t	日					通期
ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型・後方超小旋回型・超低吊] 山積0.45m3(平積0.35m3) 吊2.9t	日					通期
ﾀｲﾔﾛｰﾗ[普通型] 運転質量8～20t	日					通期

集計一覧表

名称 ・ 規格 ・ 条件	単位	数　量	単　価	金　額	雑	摘　要
振動ﾛｰﾗ[舗装用](ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式) 運転質量 0.8～1.1t	日					通期
工事用水中ﾎﾟﾝﾌﾟ(潜水ﾎﾟﾝﾌﾟ) 口径150mm 揚程10m 7.5KW	日					通期
発動発電機[ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ駆動] 25kVA 31.3ps	日					通期
U型側溝 L2000 1000kg以下 昼 無	m	32				通期
構造物取壊し工 昼間 鉄筋構造物 機械施工 制約無	m3	1				通期
ｾﾒﾝﾄ(普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ) 25kg袋入	t	0				
ﾋｭｰﾑ管(外圧管1種) B形 400×35×2430 306kg/本	本	2				
軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油 1.2号	L	1,905				
ｶﾞｿﾘﾝ ﾚｷﾞｭﾗｰ	L	2				
生ｺﾝｸﾘｰﾄ 高炉B 18-8-40	m3	0				

集計一覧表

名称 ・ 規格 ・ 条件	単位	数　　量	単　　価	金　　額	雑	摘　　要
再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40	m3	34				
単粒度砕石 5号 20-13mm	m3	1				
建設廃棄物処理費 中間処理･再生資源化施設 仙台東 東北黒沢建設工業㈱ 鶴巣ﾘｻｲｸﾙｾﾝﾀｰ ｺﾝｸﾘｰﾄ有筋	m3	1				
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ損料 ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ 4t積級(ﾀｲﾔ損耗費及び補修費(良好)を含む)	供用日					
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ損料 ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ 10t積級(ﾀｲﾔ損耗費及び補修費(良好)を含む)	供用日					
砂 洗い細目	m3	0				
合　計						

積　算　情　報　表

(0700000001-0)

項　　目	内　　容	項　　目	内　　容
積算区分	実施	週休2日の補正	1：工期全体（通期）の週休２日
変更回数	当初	（週休2日）共通仮設費	1.02
積算基準ﾊﾟﾀｰﾝ	40:令和6年度国交省諸経費改訂(消費税10%)R6週休2日補正	（週休2日）現場管理費	1.03
施行主体名	富谷市	（週休2日）機械経費係数	1.02
設計書名(1行目)	市道深苗代線修繕工事	（週休2日）労務単価係数	1.02
設計書名(2行目)		（週休2日）交替制工事	なし
設計書名(3行目)		（週休2日）市場単価係数	適用する
工事箇所		一般管理費補正率	0%
路線･河川名		契約保証費率	金銭的保証
工事番号		着工年月日	令和　年　月　日
設計年度	令和07年度	竣工期限	令和　年　月　日
設計年月日	令和07年05月01日	工期開始	令和　年　月　日
単価適用日付	令和07年05月01日 (79)	工期終了	令和　年　月　日
単価適用地区	01 地区	工期日数	0日
適用率(工種区分)	04 道路改良工事	工種名	道路改良工事
間接工事費の被災地補正	0：補正しない	請負人	
前払金支出割合区分	３５％を超える		
共通仮設費補正	一般交通影響あり(2)		
現場環境改善費	計上する		
現場環境改善費地域	大都市･市街地以外		
現場管理地域補正	一般交通影響あり(2)		
現場管理費率の補正(施工時期)	なし		

令和７年度　市道深苗代線修繕工事

位置図

施工区域図

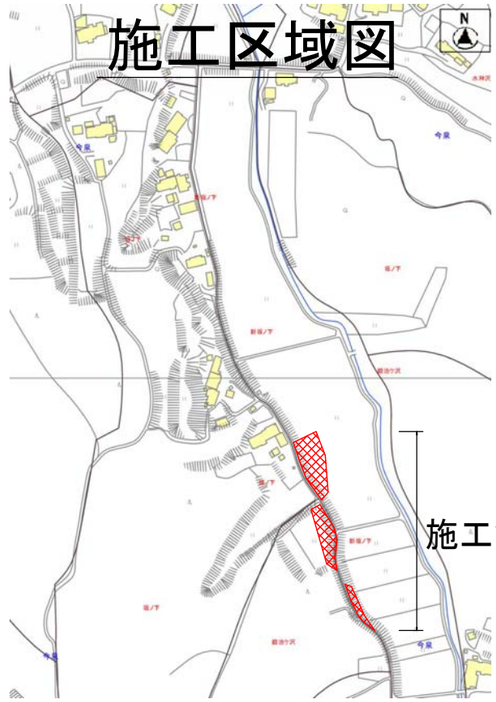

平面図

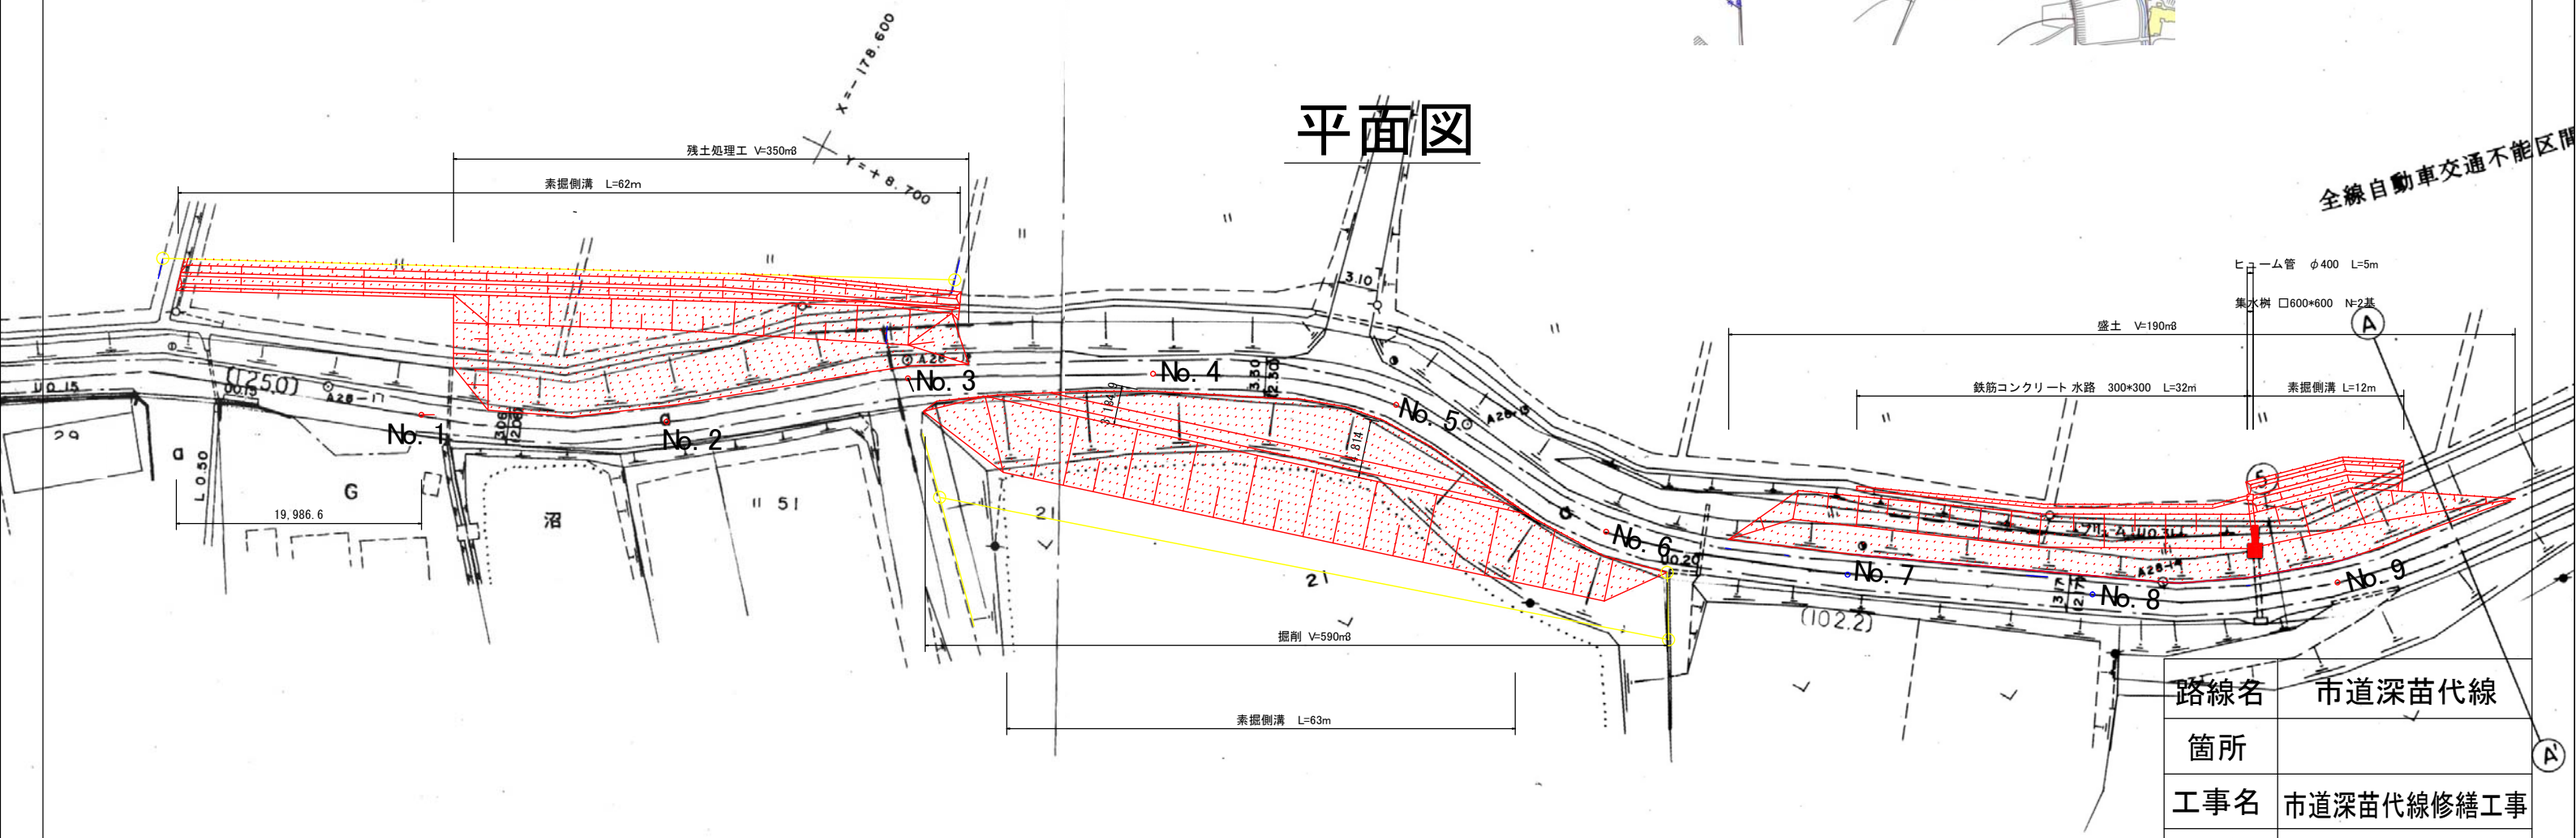

路線名	市道深苗代線
箇所	
工事名	市道深苗代線修繕工事
図名	図示
縮尺	1：500

令和７年度　市道深苗代線修繕工事

素掘側溝

S=1：20

（ 水田部）

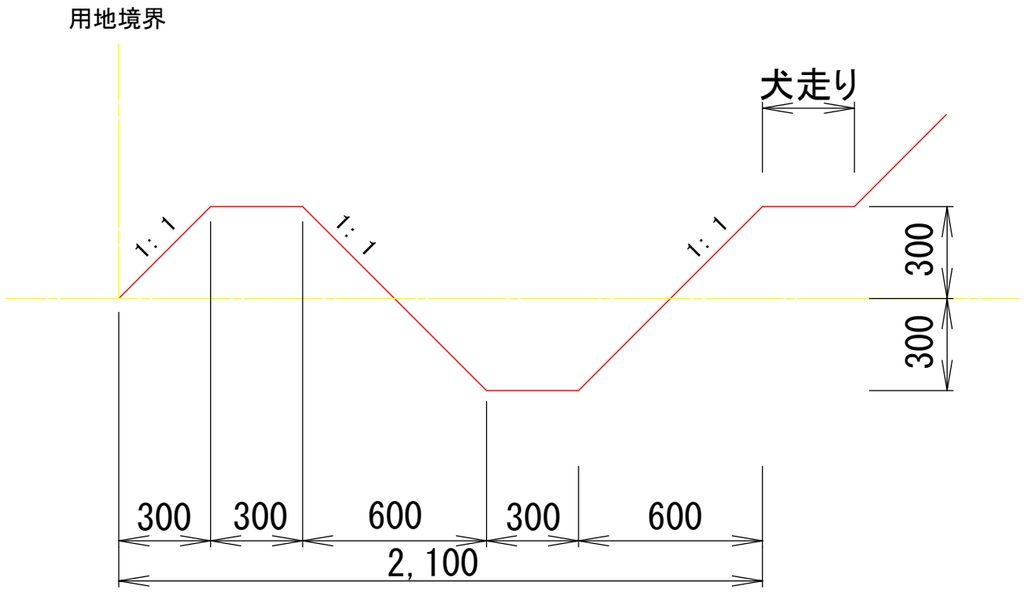

（ 道路部）

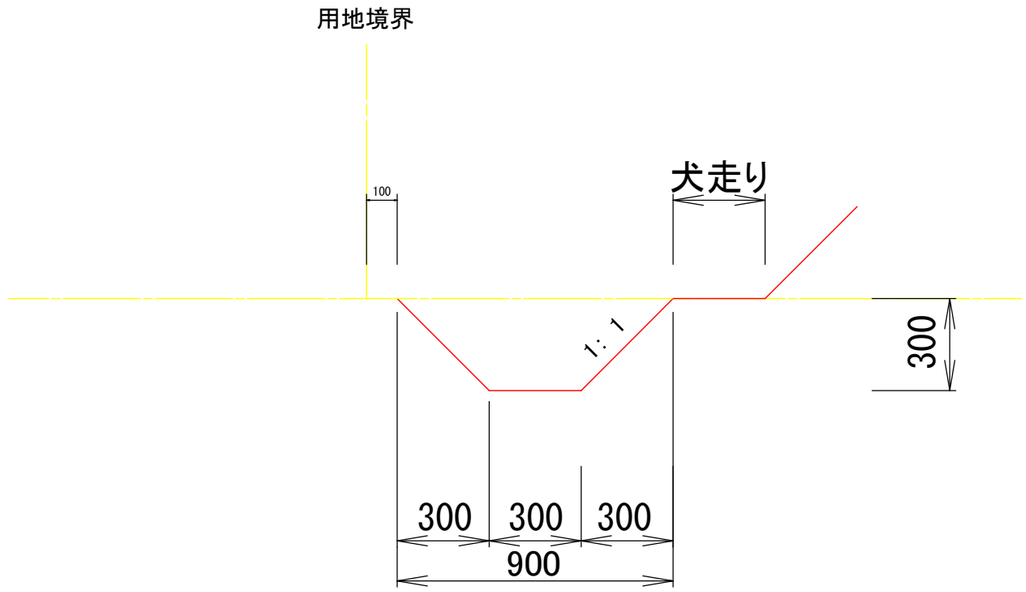

鉄筋コンクリート 水路 B500×H500型 標準断面図

S=1：10

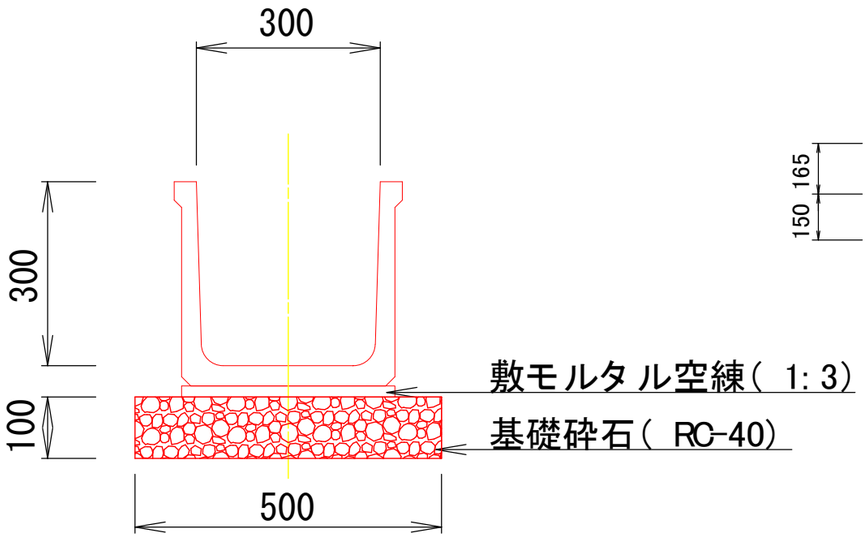

ヒューム管 B形 Ⅰ種 φ400 標準断面図

S=1：20

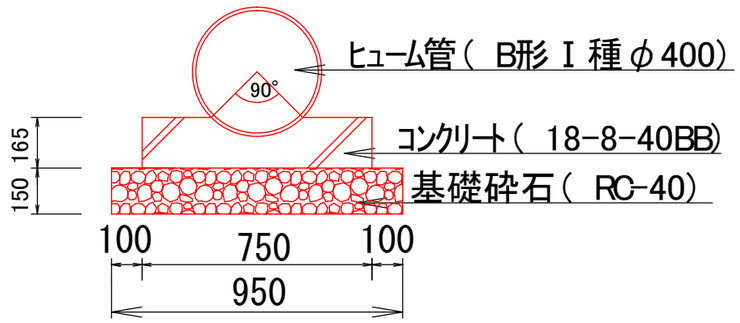

集水桝 600×600 標準断面図

S=1：20

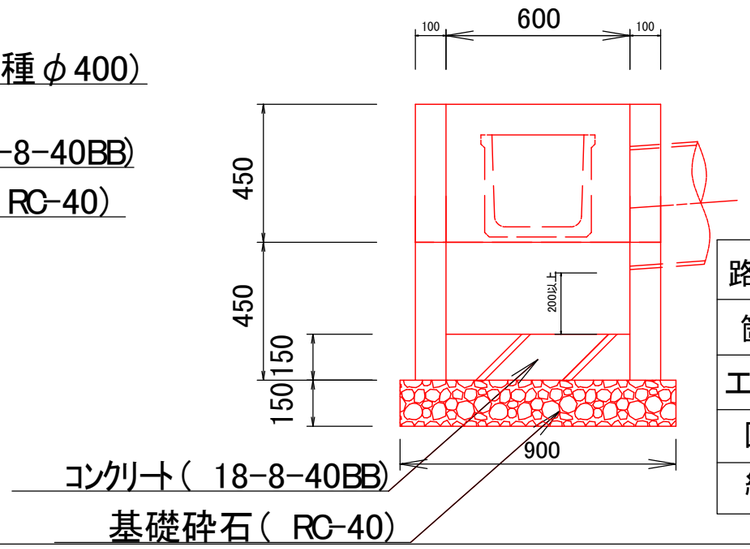

路線名	市道深苗代線
箇所	
工事名	市道深苗代線修繕工事
図名	図示
縮尺	図示

令和７年度　市道深苗代線修繕工事

横断図

S=1：100

No. 4+10. 0

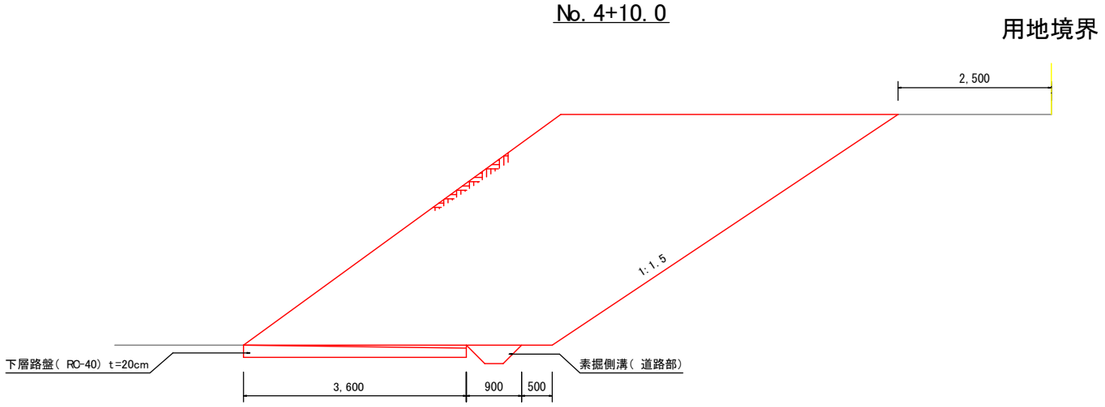

No. 5+19. 24

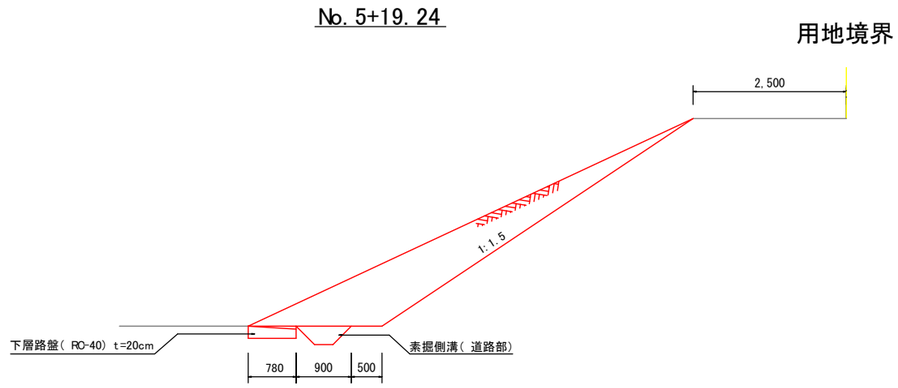

No. 4+1. 15

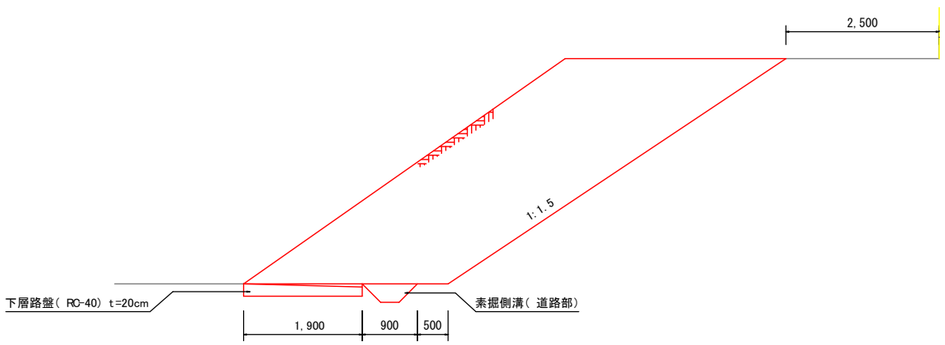

No. 5+10. 0

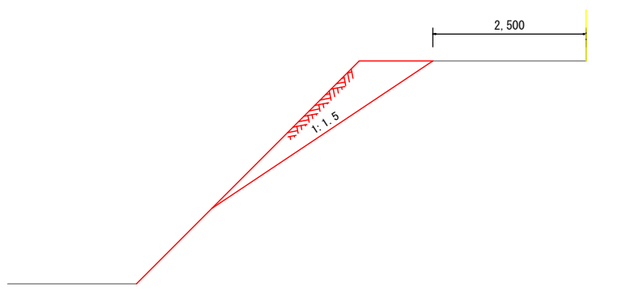

No. 3+11. 0

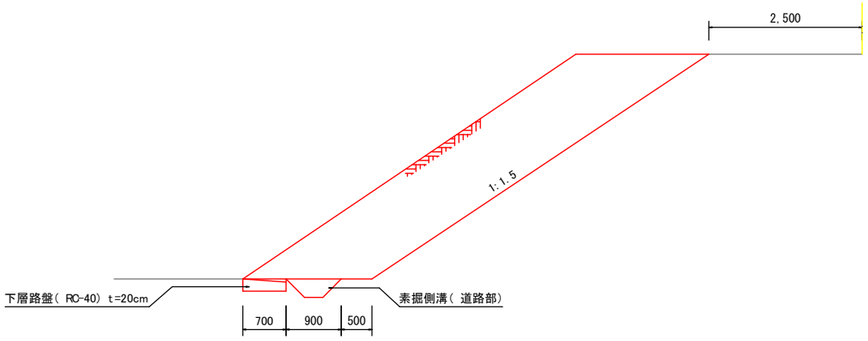

No. 5+0. 0

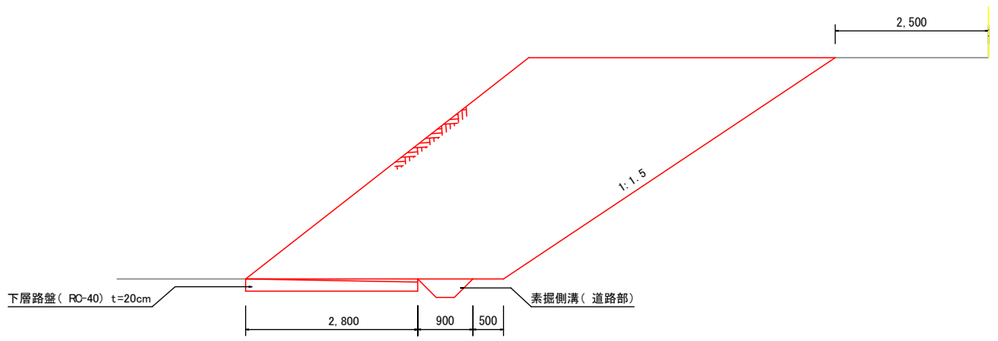

路線名	市道深苗代線
箇所	
工事名	市道深苗代線修繕工事
図名	図示
縮尺	図示

令和７年度　市道深苗代線修繕工事

横断図

S=1：100

No. 9+4. 0

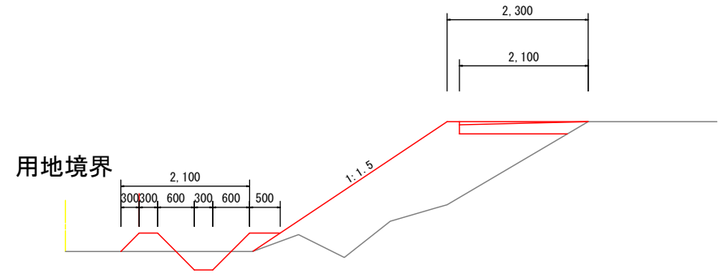

No. 8+11. 65

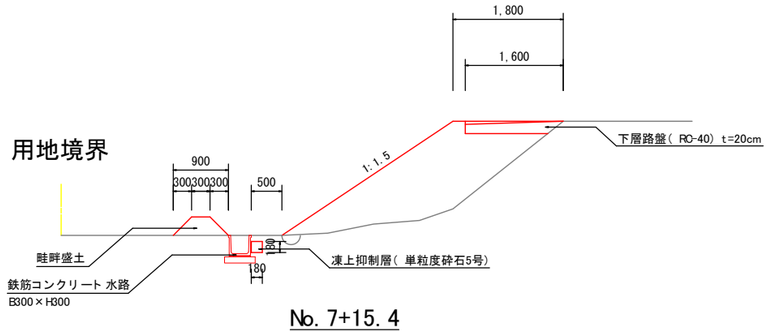

No. 7+15. 4

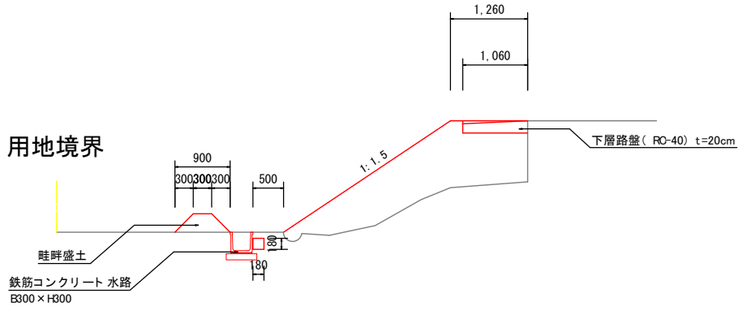

No. 6+15. 4



路線名	市道深苗代線
箇所	
工事名	市道深苗代線修繕工事
図名	図示
縮尺	図示

令和７年度　市道深苗代線修繕工事

横断図

S=1：100

No. 3+0. 0



No. 2+0. 0

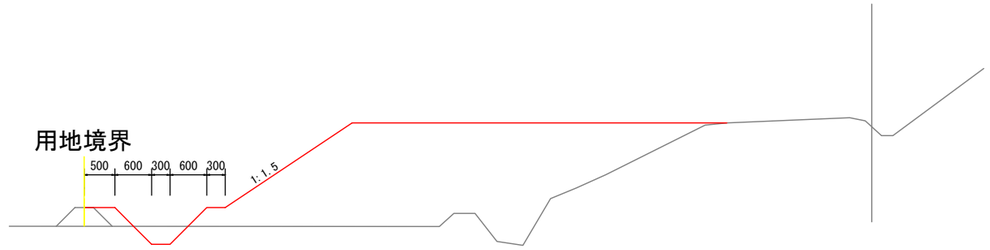

No. 1+0. 0

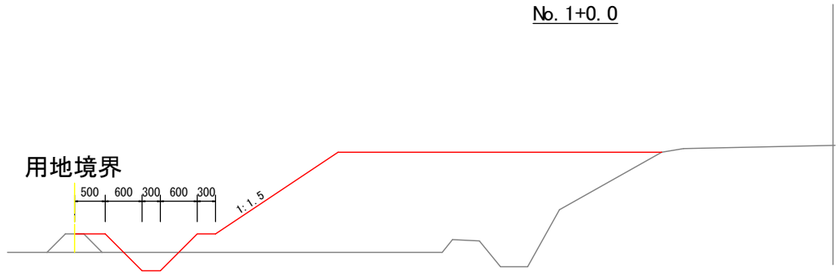

（ 残土処理工参考図）

路線名	市道深苗代線
箇所	
工事名	市道深苗代線修繕工事
図名	図示
縮尺	図示

市道深苗代線修繕工事　　工期 2025/06/26～2026/01/16 (205日)

No.	工種	上段：種別 下段：細別	単位	数量
1	準備工	準備工 準備工	式	1
2	構造物撤去工	排水構造物撤去工 構造物とりこわし工(標準単価)機械施工	m3	1
3	構造物撤去工	排水構造物撤去工 殻運搬	m3	1
4	排水構造物工	側溝工 床掘り	m3	20
5	排水構造物工	側溝工 排水構造物工(標準単価)U型側溝	m	32
6	排水構造物工	側溝工 モルタル練	m3	0.3
7	排水構造物工	側溝工 埋戻し	m3	10
8	排水構造物工	側溝工 ヒューム管(B形管)	m	5
9	排水構造物工	側溝工 プレキャスト集水桝	基	1
10	排水構造物工	側溝工 コンクリート	m3	0.05
11	排水構造物工	側溝工 床掘り(素掘側溝部)	m3	20
12	排水構造物工	側溝工 埋戻し(盛土畦畔部)	m3	20
13	道路土工	掘削工 掘削	m3	590
14	道路土工	路床盛土工 土砂等運搬	m3	190
15	道路土工	路床盛土工 路床盛土	m3	190
16	道路土工	残土処理工 土砂等運搬	m3	360
17	道路土工	残土処理工 整地	m3	360
18	道路土工	残土処理工 土砂等運搬	m3	50
19	舗装工	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工 下層路盤(車道･路肩部)	m2	178
20	仮設工	排水工 ﾎﾟﾝﾌﾟ運転工(締切排水工)	日	30
21	後片付け工	後片付け工 後片付け工	式	1

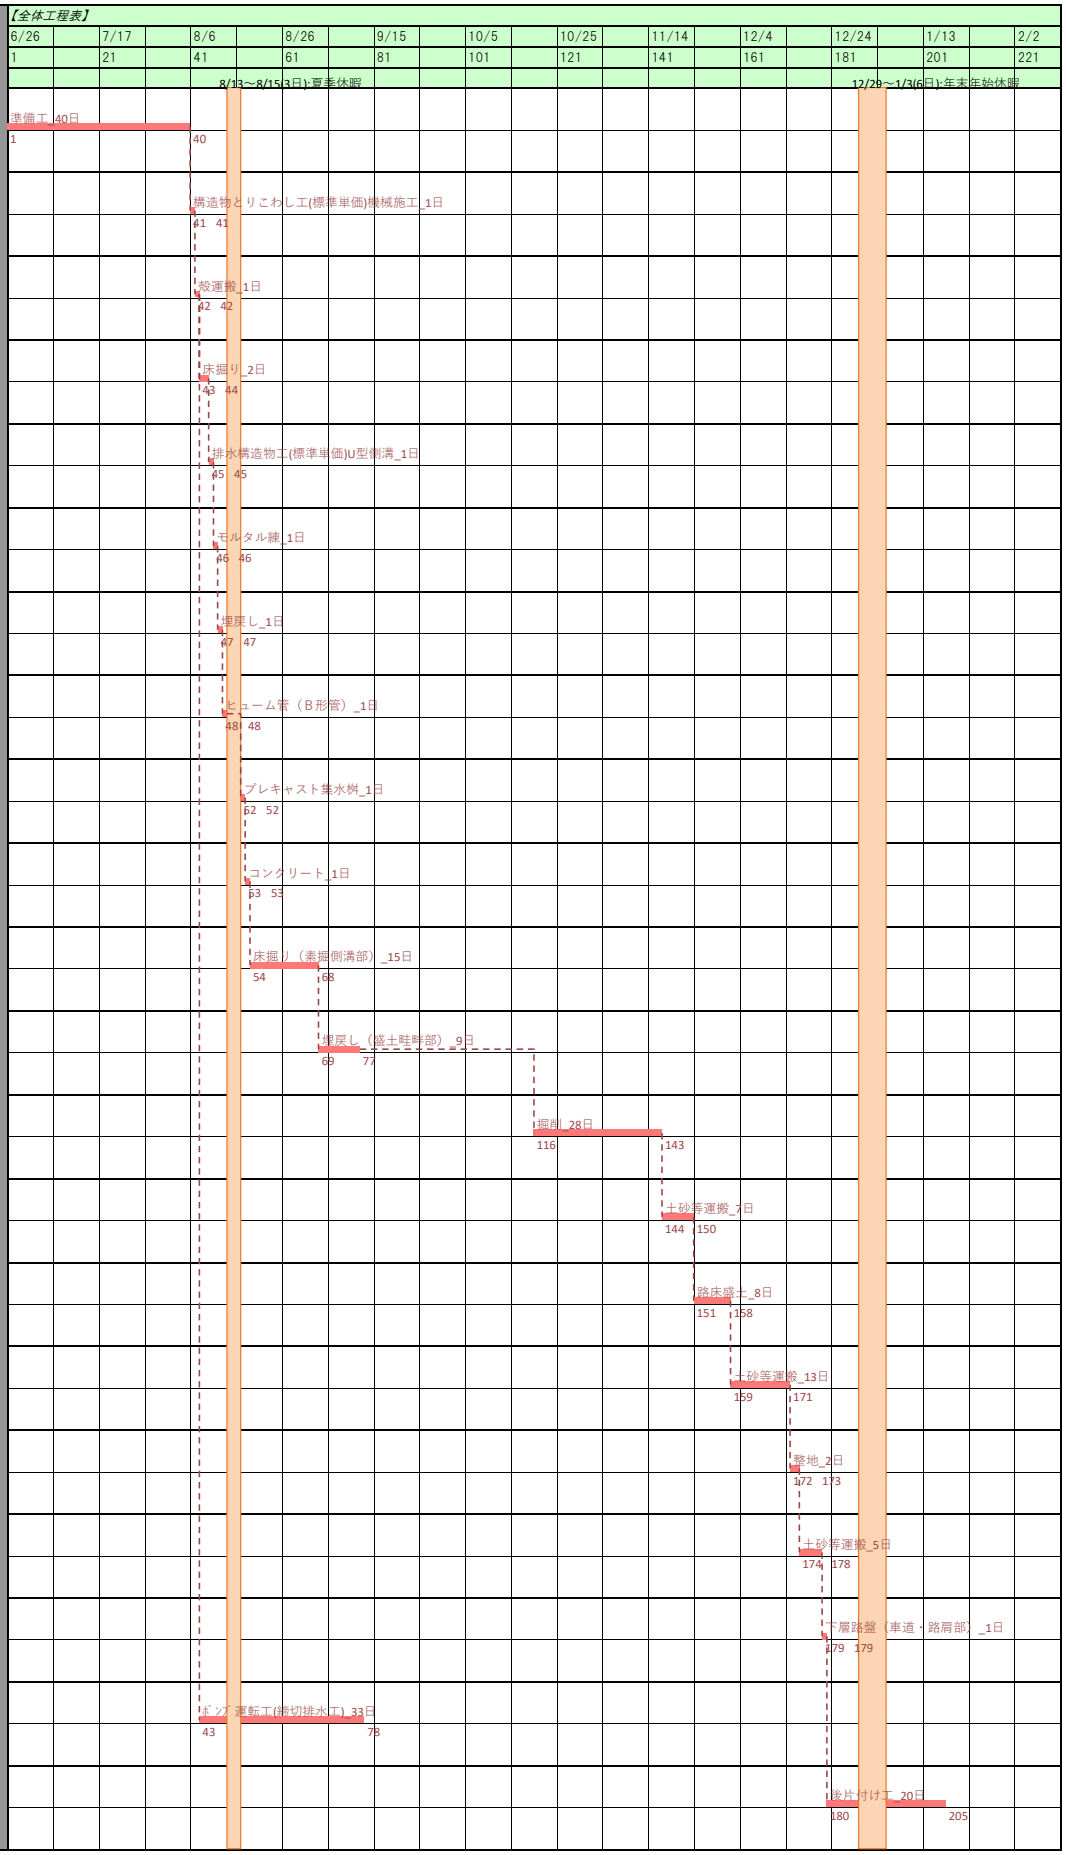

「バーチャートは、土日、祝日期間を控除して表示されますが、

これらの抑制期間は雨休率に含まれていますので注意願います。」
上記工程表は、積算上の工程であり実工程を制限するものではありません。

－ 特 記 仕 様 書 －

令和7年4月1日以降公告案件から適用

施 工 条 件 明 示 書

工事番号		工事名	令和7年度　市道深苗代線修繕工事	事務所名	富谷市建設部都市整備課

項　目	条　件	内　容	施 工 方 法	備　考
1　共通仕様書の適用		本工事は，宮城県土木部制定「共通仕様書」を適用するほか，本特記仕様書により施工するものとする。 仕様書の記載内容の優先は，「特記仕様書」「共通特記仕様書」「共通仕様書」の順とする。		
2　主任技術者及び監理技術者（以下，配置技術者という。）の配置				
(1) 現場施工に着手する日の指定 （配置技術者の配置要件の特例） ※平成25年4月1日以降適用「現場施工の着手日を指定した工事における配置技術者の配置要件の特例について」	○	契約工期初日以降，90日以内に着手 （手持ち工事が完了した場合や，制約条件がない場合等は，期日以前の着手も可能）		
(2) 請負者が着手日を選択出来る工事（フレックス工事）	○	契約工期初日以降，○○日以内に着手 土木工事共通特記仕様書第1編1－1－4によること。		
(3) 上記以外	◉	請負者は，現場施工に着手する日の指定がない限り，原則として，契約工期初日以降，30日以内に現場施工に着手		
		上記現場施工に着手する日の前日までの期間において，工事準備等を含め工事現場が不稼動であることが明確な場合は，配置技術者の工事現場への専任は要しない。 出納局契約課ホームページ参照のこと。http://www.pref.miyagi.jp/soshiki/keiyaku/kk50.html		
3　専任特例の適用を受ける技術者の配置				
		建設業法第26条第3項ただし書の規程（以下「専任特例」という。）の適用を受ける主任技術者又は監理技術者を配置する場合は、下記によるものとする。 1　専任特例の適用を受ける主任技術者又は監理技術者を配置する場合、適用要件について以下の出納局契約課ホームページを参照すること。https://www.pref.miyagi.jp/soshiki/keiyaku/kk50.html 2　本工事の主任技術者又は監理技術者が専任特例の適用を受ける場合、落札候補者となった際に確認事項兼誓約書を提出すること。 3　本工事において、専任特例の適用を受ける主任技術者又は監理技術者の配置を行う場合又は配置を要さなくなった場合は適切にコリンズ（CORIINS）への登録を行うこと。		
4　積算基準及び設計単価の適用期日				
(1) 積算基準及び設計単価の適用について	○ある ◉ない	積算基準及び設計単価は公告日の前月の基準及び単価としている。		
(2) 工事請負契約締結後における設計単価の変更	○ある ◉ない	本工事は，当初工事請負契約締結後において，契約日を基準日として設計単価の設計変更を行うこととする。 なお，設計変更の対象は，資材単価・労務単価及び機械単価等の全ての設計単価とする。 ただし，災害に伴う応急仮工事など緊急を要す工事において，積算月と契約月が同月となる場合など，工事請負契約締結後における設計単価の変更が必要ないと判断される場合においては，適用「なし」を選択することも可能とし，その場合は下欄にその理由を記載する。 適用「なし」の理由：・本工事は、工事請負契約締結後における設計単価の変更が生じる見込みがないため。		
5　工程関係				
(1) 関連工事による施工時期の調整	◉ある ○ない	NTT電柱　支線　移設工事有	移設工事　7月頃に実施予定	
(2) 施工時期による制限	◉ある ○ない	用水使用時期　田植～8月末まで 稲刈期　9月中旬～10月初旬まで	田植～10月初旬まで　主要工種（掘削、盛土等）の施工を制限する。なお、排水構造物については既存の水路を確保した施工であればこの限りではない。	
(3) 関係機関等との協議の未成立	○ある ◉ない			
(4) 関係機関等との協議結果，特定条件の付加	○ある ◉ない			
6　公害対策関係				
(1) 施工方法，機械施設，作業時間等の制限	○ある ◉ない			
7　安全対策関係				
(1) 交通安全施設等の指定	○ある ◉ない			
(2) 占用埋設物との近接工事による施工方法，作業時間の制限	○ある ◉ない			
8　排水工関係				
(1) 濁水,湧水処理のための特別な対策の必要性	○ある ◉ない			
9　建設副産物対策関係（建設発生土）				
(1) 建設発生土の処理・処分について		本工事の残土は，下記に運搬するものとする。なお，下記により難い場合が生じたときは，監督職員の指示によるものとし，設計変更の対象とする。		

			処理・処分する場所		処理・処分方法	距　離	制 限 時 間	備　考
			名称	所在地				
(2) 建設発生土	処理・処分	◉ある ○ない	安藤建設	宮城県富谷市石積道栗33-1番外	有機物・廃棄物混入不可	6.6 km	時　分 ～ 時　分	

10 建設副産物対策関係(建設発生土以外の建設副産物)

(1) 建設発生土以外の建設副産物の処理・処分について

下記の処理・処分は設計積算上の条件明示であり，処理施設を指定するものではない。なお，下記によらない場合は，監督職員と協議すること。また，処理・処分に先立ち処分場等の受入れの可否を確認すること。なお，廃棄物の処理に当たっては「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」を遵守すること(環境省または循環型社会推進課のHPを参照)。

				処理・処分する場所		処理・処分方法	距 離	制 限 時 間	
工事現場内及び工事現場間で再利用する場合は，施工管理及び契約方法等について，施工計画打合せ時に監督職員と協議すること。									
(2) 建設発生土以外の建設副産物	処理・処分	コンクリート塊	◉ある	○ない	東北黒沢建設工業㈱鶴巣リサイクルセンター	宮城県黒川郡大和町鶴巣太田砂子沢57−3	中間処理・再生資源化施設	3.3 km	時 分 ～ 時 分
		アスファルト塊	○ある	◉ない				km	時 分 ～ 時 分
		建設発生木材	○ある	◉ない				km	時 分 ～ 時 分
		建設汚泥	○ある	◉ない				km	時 分 ～ 時 分
		その他	○ある	◉ない				km	時 分 ～ 時 分
(3) 再生材の利用			◉ある	○ない	種類・数量				
11 現場環境改善			◉ある	○ない	内容 別図1を参考に工事現場に週休2日工事であることを記載したPR看板を設置するものとする。				
					現場環境改善の具体的な実施内容，実施期間については，施工計画書に明記し，監督職員と協議すること。				

12 品質証明

(1) 品質証明書および施工プロセス品質確認チェックリストの対象	○ある	◉ない	請負工事費が，1億5千万円以上の工事および発注者が必要と認める工事。 土木工事共通特記仕様書第3編1−1−9および品質証明実施要領によること。
(2) 施工プロセス品質確認チェックリストの対象	○ある	◉ない	上記に該当せず，請負工事費が1億円以上の工事。 土木工事共通特記仕様書第3編1−1−9および品質証明実施要領によること。
13 標準的な設計図書による発注方式	○ある	◉ない	土木工事共通特記仕様書第3編1−1−14によること。

14 資材関係

(1) 生コンクリート			生コンクリートの使用に当たっては，「宮城県生コンクリート品質管理監査会議」が交付する「品質管理監査合格証」を有する工場の製品，又は同等以上の品質管理を行っていることが認められる工場の製品を使用すること。
(2) 購入土			購入土を使用する場合は，材料承諾時に「採石法第33条による採取計画認可書の写し」，又は「砂利採取法第16条の採取計画認可書の写し」を提出すること。
(3) 宮城県グリーン製品の利用 「宮城県グリーン製品」利用推進指針によること。「宮城県グリーン製品」を使用した場合は，請負者は循環型社会推進課HPより「チェックリスト」をダウンロードし，使用材料や数量等を入力後，工事完了後に監督職員に提出(電子メール)すること。	必須		1.植生基盤材等，視線誘導標，型枠用合板は，原則として宮城県グリーン製品を用いること。
	○ある	◉ない	2. 盛土材,埋め戻し材
	○ある	◉ない	3. その他( )
(4) 県内産製品の使用	○ある	◉ない	本工事は，「県土木部発注工事における県内産製品優先使用の試行要領」の対象工事である。 工事の施工にあたっては，試行要領に基づき適切に実施すること。 事業管理課ホームページ参照 http://www.pref.miyagi.jp/soshiki/jigyokanri/kensanzai.html
(5) 現場吹付法枠工			吹付モルタルにおける圧縮強度の規格値は，18N/mm2以上とする。

15 設計変更の手続き

(1) 設計変更の手続きについて	設計変更については，工事請負契約書第19条～第26条及び共通仕様書第1編1−1−1−14～1−1−1−16に記載しているところであるが，その具体的な考え方や手続きについては，「工事請負契約における設計変更ガイドライン」(宮城県土木部)によることとする。
	詳細については，以下のホームページ「設計変更ガイドライン【土木工事,建設関連業務】」を参考とすること。 https://www.pref.miyagi.jp/soshiki/jigyokanri/henkou-guideline.html **トップページ > しごと・産業 > 土木・建築・不動産業 > 建設業 > 設計変更ガイドライン【土木工事,建設関連業務】**

16 その他

(1) 舗装の下請制限について	○ある	◉ない	土木工事共通特記仕様書第1編1−1−3によること。
(2) 「ダンプ土砂運搬等下請を行う工事における工事費内訳調査」の対象の有無	○ある	◉ない	本工事は「ダンプ土砂運搬等下請を行う工事における工事費内訳調査」の対象工事であり，請負者は，調査票等に必要事項を正確に記入し発注者に提出する他，ダンプ土砂運搬等下請負契約に関する関係書類を提出すること。
			請負者が本工事の一部について下請契約を締結する場合には，請負者は，当該工事の受注者(当該下請工事の一部に係る二次以降の下請負人を含む)も同様の義務を負う旨を周知すること。
(3) 三者会議の対象の有無	○ある	◉ない	本工事は，工事着手前等に当該工事の発注者，施工者，詳細設計等を担当した設計者が参加して，設計図書と現場の整合性の確認及び設計意図の伝達等を行う「三者会議」を設置する対象工事である。 土木工事共通特記仕様書第3編1−1−5によること。
(4) 貸与資料の有無	○ある	◉ない	本仕様書によるもののほか工事施工に関して必要な資料として工事契約後下記の資料を貸与する。
			貸与資料( )
(5) 発注者支援(工事監督支援業務)対象の有無	○ある	◉ない	工事監督支援業務の受注者が現場監督支援する場合，工事請負者対し「工事打合せ簿」により担当技術者(所属会社等名・氏名)の通知を行うこと。
(6) 法定外の労災保険の付保について	本工事では，法定外の労災保険加入にかかる保険料を予定価格に反映しているため，本工事において受注者は法定外の労災保険に付さなければならない。なお，加入後受注者は，工事請負契約書第62条に基づき，証券又はこれに代わるものを直ちに発注者に提示すること。		
(7) 熱中症対策に資する現場管理費補正の試行の有無	○ある	◉ない	本工事は熱中症対策に資する現場管理費率の補正の試行対象工事である。本運用による設計変更を希望する場合は，別途定める「熱中症対策に資する現場管理費補正の試行要領」に基づき，発注者に協議すること。

働き方改革・生産性向上に関する事項

項　　目	条　件		内　　容
17　総合評価落札方式における「ICT施工・3次元化等の活用提案」の適用の有無			
(1)「ICT施工・3次元化等の活用提案」の適用工事	○対象	◉対象外	1. 対象工事の場合，活用する技術については，「ICT施工・3次元化等の活用提案　工事計画書」に基づき選択すること。 2. ICT施工・3次元化等の活用提案の適用の有無に係わらず，「ICT施工・3次元化等の活用提案　工事計画書」に記載の技術は，施工計画・技術提案等(いわゆる作文)の評価対象外とする。(「簡易型(施工計画型)」，「標準型」，「高度型」の場合) なお，「ICT施工・3次元化等の活用提案」の対象外工事の場合も，同様の取扱いとする。
(2)実施された技術についての費用計上(設計変更)	○対象	◉対象外	設計変更の積算手法については，総合評価落札方式の手引きのとおりとする。なお，(1)が対象外の場合は，当該項目も対象外となる。
18　業務効率化			
(1)工事情報共有システムの活用	◉対象	○対象外	本工事は工事情報共有システムの活用対象工事であり，請負者は工事着手時に別途定める「工事情報共有システム事前協議チェックシート」により，必要事項について監督職員と協議を行うこと。実施にあたっては「土木工事における工事情報共有システムの実施要領」及び「土木工事における工事情報共有システムの活用ガイドライン」に基づき行うこと。
(2)工事書類の簡素化の試行について	◉あり	○なし	本工事は，工事書類の簡素化を目的とした試行対象工事である。実施にあたっては「宮城県土木部における工事書類簡素化の試行要領」に基づき行うこと。
(3)ウィークリースタンス等の推進	本工事は，受発注者協力のもと，建設業の魅力創出を図ることを目的にウィークリースタンス等の推進を図ることとし，「ウィークリースタンス等実施要領」に基づき，取組内容を受発注者間で協議及び共有し，工事を進めていくこととする。 詳細については，宮城県土木部事業管理課のホームページを参照すること。(http://www.pref.miyagi.jp/soshiki/jigyokanri/weekly.html)		
19　週休2日工事の適用の有無			
(1)週休2日工事	◉対象	○実施困難工事	1. 週休2日対象工事の場合は、宮城県土木部「週休2日工事」実施要領に基づき、行うことする。 なお，週休2日工事の種別及び区分については，下記(2)、(3)のとおりとする。 2. 改正労働基準法(平成30年6月成立)による罰則付きの時間外労働規制が建設業に適用されたことを踏まえ、週休2日の確保を目指し、「週休2日工事」での発注を原則とする。ただし、応急復旧工事など緊急工事の場合は、例外的に週休2日対象工事としないことも可能とする。その場合は「実施困難工事」として、下欄にその理由を記載する。 実施困難工事の理由：(例) ・応急復旧工事のため早期に工事を完成させる必要があり，週休2日の確保が困難なため
(2)週休2日工事の種別	☑現場閉	☐交替制	現場閉所型：巡回パトロールや保守点検等、現場管理上必要な作業を行う場合を除き、現場事務所での事務作業を含めて、1日を通 して現場や現場事務所を閉所する。 交　替　制　：現場閉所を行うことが困難な工事について、技術者及び技能労働者が交替しながら休日確保の取組を行う。
(3)週休2日工事の区分	週休2日工事の区分は「通期の週休2日」と「月単位の週休2日」に区分する。 当初発注においては「通期の週休2日」を指定、積算している。 「月単位の週休2日」は受注者の希望型とし、工事着手前に受発注者間で協議の上、実施の可否を決定する。なお、協議により「月単位の週休2日」を実施することとし、「月単位の週休2日」を達成した場合は、精算変更時に「月単位の週休2日」の補正係数に変更する。 [「通期の週休2日」：対象期間全体で、4週8休相当以上の休日を取得したと認められる状態。 「月単位の週休2日」：対象期間の全ての月において、4週8休以上の休日を取得したと認められる状態。]		
20　女性活躍推進モデル工事の適用の有無			
(1)女性活躍推進モデル工事	◉対象	○対象外	実施に当たっては，宮城県土木部「女性活躍推進モデル工事」実施要領に基づき行うものとする。 実施要領は，宮城県ホームページ(https://www.pref.miyagi.jp/soshiki/jigyokanri/)で確認のこと。
21　下請承認事務簡素化モデル工事の適用の有無			
(1)下請承認事務簡素化モデル工事	○対象	◉対象外	実施に当たっては，発注者から工事打合せ簿により，「下請承認事務簡素化モデル工事」である旨を別途指示するものとする。

東日本大震災に伴う特例制度

項　　目	条　件		内　　容	施 行 方 法	備　考
22 被災地以外からの労働者確保に要する間接費の設計変更の運用					
(1)労働者確保に関する積算方法の試行工事	○ある	◉ない	1 本工事は,「共通仮設費(率分)のうち営繕費」及び「現場管理費のうち労務管理費」の下記に示す費用(以下「実績変更対象間接費」という。)について, 契約締結後, 労働者確保に要する方策に変更が生じ, 宮城県土木部においては土木工事標準積算基準(宮城県土木部)に基づく金額相当では適正な工事の実施が困難になった場合は, 実績変更対象間接費の支出実績を踏まえて最終精算変更時点で設計変更する「労働者確保に関する積算方法の工事」である。 営繕費:労働者送迎費, 宿泊費, 借上費 労務管理費:募集及び解散に要する費用, 賃金以外の食事, 通勤等に要する費用 2 本工事の予定価格の算出の基礎とした設計額(宮城県土木部においては, 土木工事標準積算基準に基づき算出した額)における実績変更対象間接費の割合は次のとおりである。 1)共通仮設費(率分)に占める実績変更対象間接費(労働者送迎費, 宿泊費, 借上費)の割合: **9.19%** 2)現場管理費に占める実績変更対象間接費(募集及び解散に要する費用, 賃金以外の食事, 通勤等に要する費用)の割合: **1.24%** 3 受注者は, 実績変更対象間接費の支出実績を踏まえて設計変更を希望する場合は, 実績変更対象間接費に係る費用の内訳を記載した「労働者確保に係る実績報告書(様式1)」及び実績変更対象間接費について実際に支払った全ての証明書類(領収書, 領収書の出ないものは金額の適切性を証明する金額計算書など。)を監督員に提出し, 設計変更の内容について協議するものとする。 4 受注者の責めによる工事工程の遅れ等受注者の責めに帰すべき事由による増加費用については, 設計変更の対象としない。 5 発注者は, 実績変更対象間接費の支出実績を踏まえて設計変更する場合, 受注者が実績変更対象間接費について実際に支払った額のうち証明書類において確認された費用から, 宮城県土木部においては土木工事標準積算基準(宮城県土木部)に基づき算出した額における実績変更対象間接費を差し引いた費用を加算して算出する。なお, 全ての証明書類の提出がない場合であっても, 提出された証明書類をもって設計変更を行うものとする。 6 受注者から提出された資料に虚偽の申告があった場合については, 法的措置及び入札参加資格制限等の措置を行う場合がある。 7 受注者は, 実績変更対象間接費にかかる設計変更について疑義が生じた場合は, 監督員と協議するものとする。		
(2)労働者宿舎設置に関する積算方法の試行工事	○ある	◉ない	本工事は,「労働者宿舎設置に関する試行要領」(以下試行要領)の対象工事である。 労働者宿舎の設置を希望する場合については,「試行要領」に基づき監督職員と事前に協議すること。		
23 遠隔地からの建設資材調達に係る設計変更					
(1)遠隔地からの建設資材調達に係る設計変更	○ある	◉ない	下記の建設資材は, 通常地域内から調達することを想定しているが, 安定的な確保を図るために, 当該調達地域以外から調達せざるを得ない場合には, 事前に監督職員と協議するものとする。 また, 購入費及び輸送費に要した費用については, 証明書類(契約書及び納品書等)を添付するものする。なお, 添付する証明書類(契約書及び納品書等)は原本を提示(写しの提出)とし, 受注者名, 納品者名, 使用資材名, 規格・形状, 使用(納品)日, 使用(納品)数量等が記載されている物を監督員に提出し, その費用について設計変更することとする。 購入費の対象は, 生コンクリート・アスファルト合材・石材等(山砂, 砕石, 捨石, 被覆石等)とする。 輸送費の対象は, 仮設材(鋼矢板等)とする。	受注者は, 購入費及び輸送費を変更したい場合は,「工事打合せ簿」に次の事項を記載し発注者に提出し協議するものとする。 1 地域内及び基地に, 建設資材がないことを証明する資料(打合せメモ等) 2 遠隔地から購入及び輸送する建設資材の名称・規格及び製造・生産工場の名称(使用材料の建設資材名及び規格・形状等の証明資料「品質証明」) 3 遠隔地から建設資材を購入及び輸送する理由 4 製造・生産工場を選定した理由 5 見積もり書 6 その他, 必要と思われる事項	
24 施工箇所が点在する工事の間接費の積算					
(1)施工箇所が点在する工事積算方法の試行の対象工事	○ある	◉ない	本工事は, 施工箇所が点在する工事であり, 共通仮設費及び現場管理費について標準積算と施工実態に乖離が考えられるため,「○○地区(施工箇所○○, ○○), △△地区(施工箇所○○), □□地区(施工箇所○○)(以下, 対象地区という)」ごとに共通仮設費及び現場管理費を算出する「施工箇所が点在する工事積算方法の試行」の対象工事である。	本工事における共通仮設費の金額は, 対象地区毎に算出した共通仮設費を合計した金額とする。また, 現場管理費の金額も同様に, 対象地区毎に算出した現場管理費を合計した金額とする。なお, 共通仮設費率及び現場管理費率の補正(大都市, 施工地域等)については, 対象地区毎に設定する。	
25 その他					
(1)土砂等建設資材を供給元で引取する場合の積算の取扱い	○ある	◉ない	・本工事の施工において, 調達(購入)する予定の○○の設計単価は, 現場持込価格(単価)としている。 ただし, 契約後, 施工計画に基づき, ○○の調達条件について異なる場合は, 監督職員と協議すること。 ・資材搬入において, 標準作業以外の作業(現場外の仮置き等)が生じる場合は, 監督職員と協議すること。		
(2)東日本大震災の復旧・復興事業等における積算方法等に関する試行について	○ある	◉ない	間接工事費(共通仮設費及び現場管理費)について, 工事量の増大による資材やダンプトラック等の不足による作業効率の低下等により現場の実支出が増大し, 積算基準による積算とかい離が生じていることが確認されたため, 積算基準書等により各工種区分に従って対象額ごとに求めた共通仮設費率及び現場管理費率に, それぞれ以下の補正係数を乗じている。 補正係数　共通仮設費:1.3　現場管理費:1.1		

特　記　事　項

1　追加事項1			
(1) 交通誘導警備員Bの人数について	20人計上している。なお、施工条件等に変更があった場合は対応方法について別途協議し設計変更の対象とする。		
(2) 構造物取壊し工について	既設側溝および集水桝等の取壊し数量については、条件等に変更があった場合は、対応方法について別途協議し設計変更の対象とする。		
(3) 排水工について	水替えに伴うﾎﾟﾝﾌﾟ運転日数については、当初30日を計上している。なお、条件等に変更があった場合は、対応方法にういて別途協議し設計変更の対象とする。		
(4) 残土処理工について	掘削で発生した残土は現場内流用および仮置きで対応するものとする。なお、工事区間内で処理しきれない分については処分場へ運搬するものとし、施工条件等に変更があった場合は、別途協議の上、設計変更の対象とする。		
(5) 追加			
2　追加事項2			
(1) 追加			
(2) 追加			
(3) 追加			
(4) 追加			
(5) 追加			
3　追加事項3			
(1) 追加			
(2) 追加			
(3) 追加			
(4) 追加			
(5) 追加			
4　追加事項4			
(1) 追加			
(2) 追加			
(3) 追加			
(4) 追加			
(5) 追加			
5　追加事項5			
(1) 追加			
(2) 追加			
(3) 追加			
(4) 追加			
(5) 追加			
6　追加事項6			
(1) 追加			
(2) 追加			
(3) 追加			
(4) 追加			
(5) 追加			
7　追加事項7			
(1) 追加			
(2) 追加			
(3) 追加			
(4) 追加			
(5) 追加			

別図１

ＰＲ看板参考図

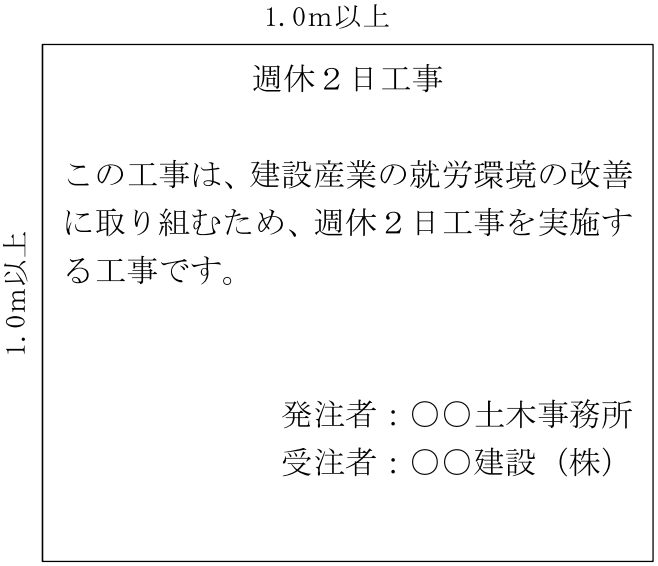

※受注者は，工事現場の見やすい位置にＰＲ看板を設置するものとする。
